Declaration prealable - Piscine

Parcelle AE 101 - Piscine 1 - Le Vesinet - parcelle AE 101

Regime d’autorisation

Formalite	Declaration prealable (cerfa ndeg 13703) Bassin de 32,0 m2 : de 10 a 100 m2, declaration prealable.
Formulaire	cerfa ndeg 13703 (declaration prealable - construction et travaux non soumis a permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes) A telecharger sur service-public.fr dans sa derniere version, ou a deposer en ligne sur le guichet numerique de la commune.
Delai d’instruction	1 mois (2 mois en secteur protege) A compter du depot complet ; le silence vaut accord, sauf en secteur protege ou une decision expresse est necessaire pour la DP.
Taxe d’amenagement	8 000 EUR de base (250 EUR/m2 x 32,0 m2) Montant = base x (taux communal + taux departemental). Avis dans les 6 mois suivant l’autorisation.
Apres les travaux	DAACT, puis declaration fonciere H1 (cerfa ndeg 6650) dans les 90 jours Le bassin entre dans la valeur locative ; declare a temps, il est exonere de taxe fonciere deux ans.

Description du projet (notice DP)

Creation d’une piscine enterree de 32,0 m2 de plan d’eau (environ 8,00 x 4,00 m), fond plat, profondeur 1,20 m, volume 38 m3. Structure : coque polyester, gelcoat (coque). Le haut des parois est au niveau du terrain naturel. Margelles de 33 cm en pierre reconstituee ou naturelle. Local technique enterre prefabrique a 5 m du bassin. Dispositif de securite : alarme (nf p90-307). Eau du bassin raccordee a l’assainissement pour les vidanges, pas de rejet au milieu naturel.

Materiaux et couleurs : eau #5bb7e6, margelles #d9d2c3. Terrain : les deblais sont evacues (88 m3) ; aucun mouvement de terre ne modifie le niveau du terrain hors de l’emprise du bassin et de sa plage.

Aide au remplissage du cerfa 13703

Chaque rubrique du formulaire, avec la valeur lue dans le plan. Les cadres sur le demandeur (identite, adresse, courriel) sont a remplir a la main.

Cadre 3 - Terrain : adresse	Le Vesinet Completer le numero, la voie et le code postal.
Cadre 3 - References cadastrales	AE 101 - Le Vesinet Prefixe, section et numero de chaque parcelle du terrain.
Cadre 3 - Superficie du terrain	750 m2
Cadre 4 - Nature des travaux	Construction nouvelle : piscine enterree Cocher " piscine " ; preciser le bassin et son local technique.
Cadre 4 - Courte description	Piscine enterree de 32,0 m2, coque polyester
Cadre 4 - Destination	Habitation (annexe)
Cadre 5 - Surface de plancher creee	0 m2 Un bassin ne cree pas de surface de plancher.
Cadre 5 - Emprise au sol creee	32,0 m2 Le plan d’eau compte dans l’emprise au sol ; les margelles et une plage au niveau du sol n’en font pas partie.
Cadre 5 - Nombre de logements	Sans objet
Cadre 6 - Piscine : superficie du bassin	32,0 m2 C’est l’assiette de la taxe d’amenagement (declaration des elements necessaires au calcul des impositions).
Cadre 6 - Hauteur hors sol	0 m (bassin enterre)
Cadre 6 - Abri de piscine	Non
Cadre 7 - Engagement du demandeur	Date et signature Le dispositif de securite normalise est obligatoire a la mise en eau pour un bassin enterre ou semi-enterre.

Pieces du dossier

- [x] DP1 - Plan de situation du terrain - page de ce dossier
- [x] DP2 - Plan de masse cote dans les trois dimensions - page de ce dossier
- [x] DP3 - Plan en coupe precisant l'implantation par rapport au profil du terrain - page de ce dossier
- [ ] DP4 - Plan des facades et des toitures (bassin hors-sol, local technique, abri) - a fournir par le demandeur
- [ ] DP5 - Representation de l'aspect exterieur (si modification visible) - a fournir par le demandeur
- [ ] DP6 - Document graphique d'insertion dans l'environnement - a fournir par le demandeur
- [ ] DP7 - Photographie du terrain dans l'environnement proche - a fournir par le demandeur
- [ ] DP8 - Photographie du terrain dans le paysage lointain - a fournir par le demandeur
- [ ] DP11 - Notice en secteur protege (materiaux, couleurs) - a fournir par le demandeur

Deux exemplaires papier, ou un depot dematerialise. Ajouter un exemplaire par piece en secteur protege.

DP1 - Plan de situation

Parcelle AE 101

Le Vesinet - 48,89000 N, 2,13000 E

La parcelle du projet est tracee en trait fort ; le bassin en bleu.

A completer par un extrait de carte (IGN, cadastre.gouv.fr) a plus petite echelle.

N

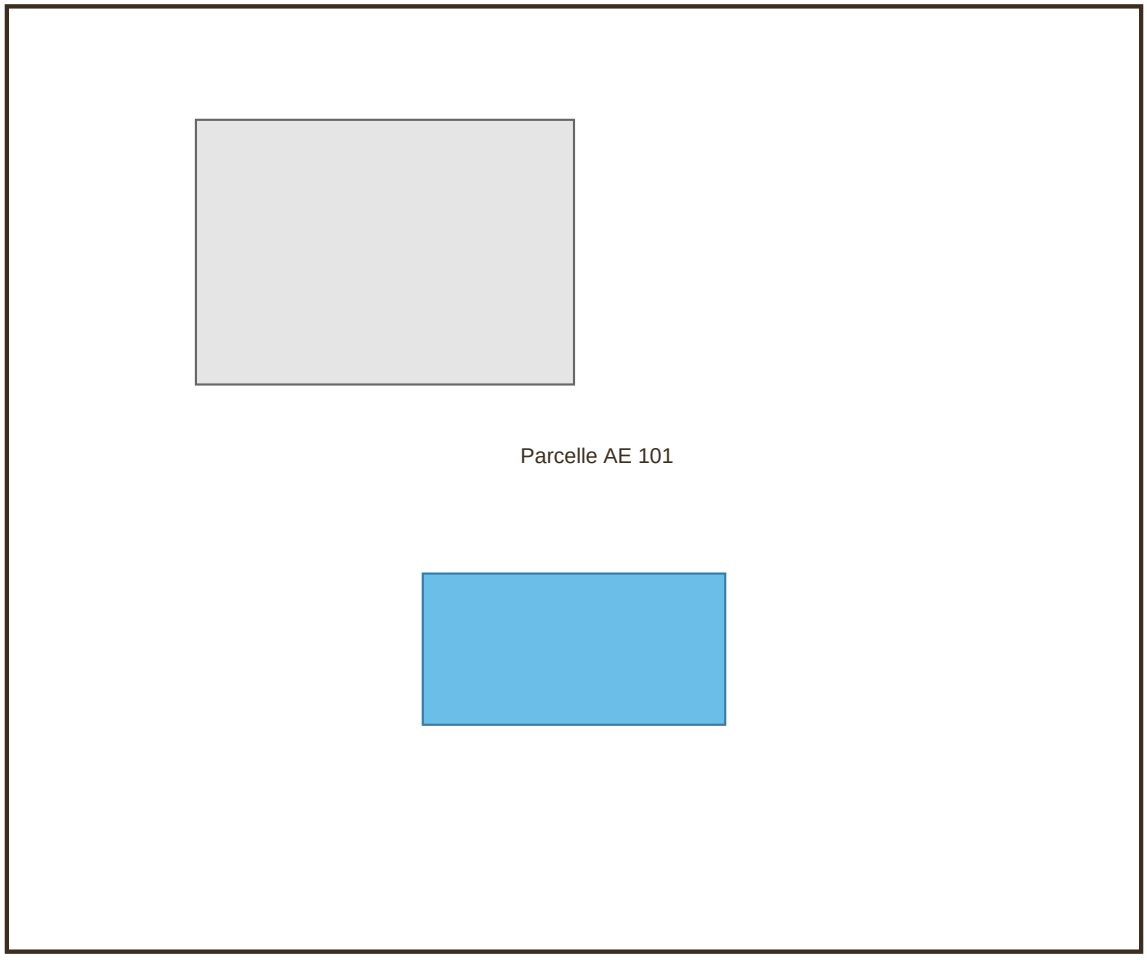

Echelle 1/200

0 10 m

DP2 - Plan de masse

Parcelle AE 101

Bassin Piscine 1 : 32,0 m2 de plan d'eau, enterree

Distances du bassin aux limites separatives cotees ; cotes de la parcelle en gris.

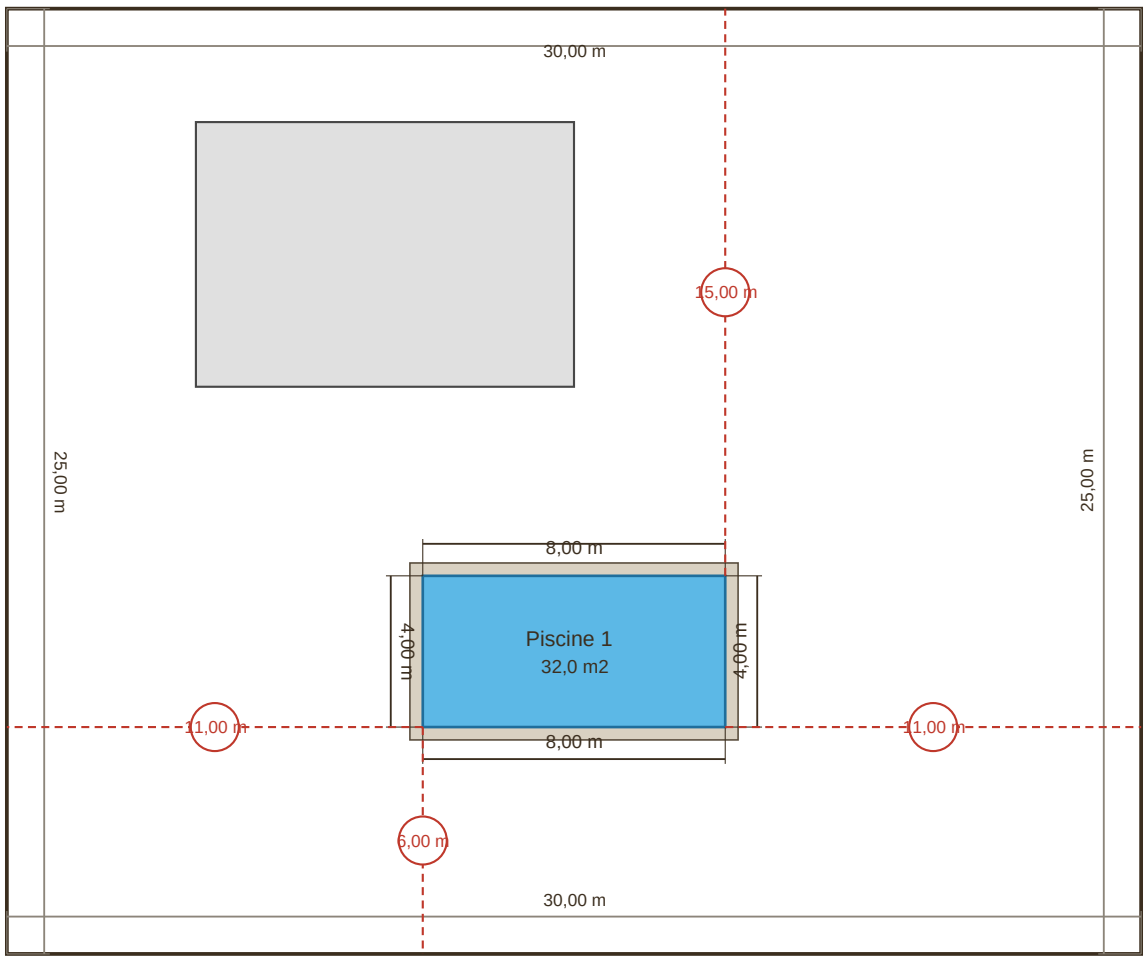

Echelle 1/200

0 — 10 m

Surfaces et implantation

Parcelle	750 m2	
Plan d'eau (emprise au sol creee)	32,0 m2	32,0 m2 avec le local
Margelles	8,4 m2	33 cm
Plage	-	
Emprise totale (bassin, margelles, plage)	40,6 m2	5,4 % de la parcelle
Distance a la limite Sud	6,00 m	
Distance a la limite Est	11,00 m	
Distance a la limite Nord	15,00 m	
Distance a la limite Ouest	11,00 m	

DP3 - Plan en coupe

Piscine 1 - coupe AA selon l’axe du petit bain au grand bain

Terrain naturel en trait fort ; cotes en metres ; echelle 1/75.



Echelle 1/75

0 2 m

Hauteur des parois 1,30 m (profondeur maximale + revanche 10 cm) ; fouille 1,50 m sous le terrain naturel.

Structure : Coque polyester, gelcoat (coque) ; fond fond plat.

Pieces a joindre par le demandeur

Insertion et photographies : coller ou imprimer dans les cadres

Ces pieces ne peuvent pas etre produites depuis le plan.

DP6 - Document graphique d’insertion

Photomontage ou croquis du bassin et de sa plage vus depuis l’espace public ou le jardin, dans leur environnement.

DP7 - Photographie proche

Le terrain et l’emplacement du bassin, pris depuis la maison ou la limite voisine la plus proche.

DP8 - Photographie lointaine

Le terrain dans la rue ou le paysage, pris depuis l’espace public.

Annexe - Note de calcul : Piscine 1

Pre-dimensionnement d'avant-projet, cale sur les usages du metier (temps de recyclage, vitesse de filtration, NF DTU 51.4 pour la plage en bois). Ce n'est ni une etude de sol ni une note de calcul beton : la structure du bassin releve de l'etude d'execution ou de la notice du fabricant.

1. Geometrie et volume

Implantation	Enterree
Plan d'eau	32,0 m2, perimetre 24,00 m Mesure au nu interieur des parois ; c'est la surface que l'urbanisme compte.
Fond	Fond plat : 1,20 m
Volume d'eau	38,4 m3 Surface x profondeur.
Hauteur des parois	1,30 m Profondeur maximale + revanche de 10 cm (du plan d'eau au haut des parois).
Partie enterree	1,30 m

2. Terrassement

Emprise de la fouille	45,3 m2 Parois de 1 cm plus 50 cm de surlargeur de travail, parois de fouille supposees verticales.
Profondeur de fouille	1,50 m Partie enterree + 20 cm sous le fond (lit de pose en gravier).
Deblai	67,9 m3
Remblai en gravier drainant	19,6 m3
Evacuation	88,3 m3 Foisonnement de 30 %.

Sans etude de sol : une nappe haute, un rocher ou un remblai recent changent la fouille, le drainage et le fond (plot de lestage, vide sanitaire, puits de decompression).

3. Structure du bassin

Structure	Coque polyester, gelcoat (coque)
Pression de l'eau au fond	11,8 kPa rho.g.h, avec h la profondeur maximale.
Poussee de l'eau sur une paroi	8,3 kN par metre de paroi rho.g.h2/2 sur la hauteur de paroi ; la poussee des terres s'y oppose bassin plein et s'exerce seule bassin vide.
Pose	Lit de gravier de 20 cm, remblai en gravier roule Remblayer par couches en meme temps que la mise en eau : la coque ne tient que remplie et soutenue.

Pre-dimensionnement d'avant-projet : le beton, le ferraillage et le drainage relevent d'une etude d'execution (DTU 65.11 reservoirs, Eurocode 2) et de la notice du fabricant pour une coque ou un kit.

4. Abords

Margelles	25,4 ml de 33 cm (51 pieces de 50 cm)
Plage	Aucune (gazon, gravier)

5. Hydraulique et filtration

Temps de recyclage	4 h Le volume passe entierement au filtre en ce temps.
Debit de filtration	9,6 m3/h Volume / temps de recyclage.
Filtre a sable	diam. 500 mm (0,19 m2 de section necessaires) Vitesse de filtration de 50 m/h ; diametre du commerce immediatement superieur.

Pompe	0,75 CV
Skimmers	2 (un pour 25 m2) Face aux vents dominants ; en hors-sol, un skimmer flottant ou de kit.
Refoulements	3 buses (une pour 15 m2, deux au moins)
Bonde de fond, prise balai	1 et 1 La bonde au point bas du grand bain.
Canalisations	PVC pression diam. 50 mm, 59 ml Local technique a 5,00 m ; un circuit par piece a sceller, plus le tour du bassin.

6. Equipements

Local technique	Local technique enterre prefabrique
Eclairage	2 projecteur(s) LED 12 V (un pour 25 m2)
Traitement	Chlore
Chauffage	Aucun

7. Securite et reglementation

Securite	Alarme (NF P90-307) - 1 u Obligatoire pour tout bassin enterre ou semi-enterre non clos (loi du 3 janvier 2003, art. L.128-1 du CCH). Un bassin hors-sol en est dispense mais reste conseille.
Autorisation d'urbanisme	Declaration prealable (cerfa ndeg 13703) Aucune formalite jusqu'a 10 m2 hors secteur protege ; declaration prealable de 10 a 100 m2 (et pour un bassin hors-sol installe plus de trois mois par an) ; permis au-dela de 100 m2 ou avec un abri de plus de 1,80 m.
Distances aux limites	Sud : 6,00 m ; Est : 11,00 m ; Nord : 15,00 m ; Ouest : 11,00 m A comparer au reglement de zone du PLU (souvent 3 m, parfois 1 m ou plus) et au Code civil (vues).
Taxe d'amenagement	8 000 EUR de base 250 EUR/m2 de plan d'eau, a multiplier par les taux communal et departemental (de 1 a 5 %, plus 2,5 % au plus).
Apres les travaux	Declaration d'achevement (DAACT) et declaration fonciere H1 (cerfa ndeg 6650) dans les 90 jours Le bassin entre dans la taxe fonciere ; une exoneration de deux ans suit la declaration faite a temps.
